
T-0-26: bicikli és szezonális holmik

A garázsszinti tároló 4,00 m². A 2500×1600 mm keret és az ajtó a jelen tervben feltételes.

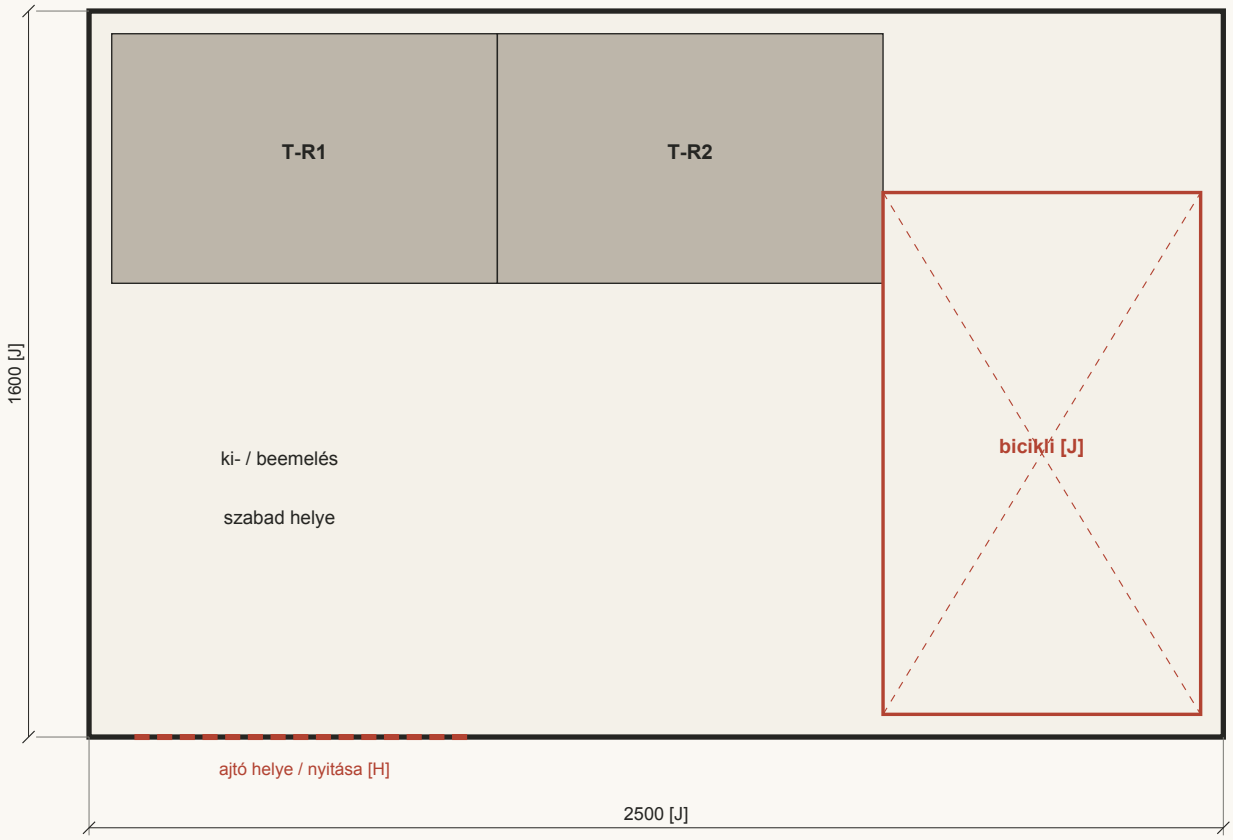

A bicikli helyét is megrajzoltuk

A déli fal jobb sarkán 1 függőlegesen tárolt bicikli helye látható. Elfordítottuk a próbát, így mindkét BROR megmarad; a jobb polc 50 mm-rel balra kerül. A bicikli és a polc között nincs tartalékhézag: az ajtóval, falrögzítéssel és kiemeléssel együtt még ellenőrizni kell.

Bőröndök és dobozok

A két alsó magas rekeszben összesen 4 darab 350×500×700 mm-es próbabőrönd férőhelye van; 25% tartalékkal 3-mal számoljunk. A felső 6 polcon 12 darab 350×500 mm-es dobozhelyből 9-et töltsünk meg. A bicikli miatt a külön padlón álló bőröndhely megszűnik.

Miért tart hónapokig? Mi jöhet közbe?

A felmérés, anyagminta, ajánlat, gyártás és beépítés egymásra épül. A korábbi terv 14–16 hetet irányzott elő a döntésektől; ez nem visszaigazolt határidő. A rossz méret, elhúzódó mintázás vagy későn kiválasztott vasalat újragyártást okozhat.

Hogyan lehet gyorsítani?

Egy közös felmérésen rögzítsük a lakást, két tárolót és kiállásokat. A médiafal mintája és a gardrób működési mintája párhuzamosan készüljön. Azonos rajzrevízióra kérjünk összehasonlítható ajánlatokat; rendelés csak a változat, ár és átfutás jóváhagyása után.
