# Egy nyugodt otthon, erős személyiséggel.



Kiválasztott V3.3 nappali célkép. A megvalósítás részletei még egyeztetés alatt állnak.

## 01

### A tusgrafika adja a karakterét.

A nagy falkép és a TV-fal egy közös vizuális nyelvet kap. Kevés, jól elhelyezett hangsúly elég ahhoz, hogy a lakás felismerhető legyen.

## 02

### Este is jó lesz hazajönni.

A meleg fény, a puha textil és a grafit felületek együtt adják a hangulatot. A rejtett világítást valódi profilokból és elérhető szerelési helyekkel tervezzük.

## 03

### A rend is része a látványnak.

A gardróbok, az előtéri tároló és az egyedi bútorok a hétköznapi tárgyaknak adnak helyet. A szép összkép akkor működik, ha használat közben is rendezhető.

### A projekt az egész otthonról szól.

Három háló, konyha, nappali-étkező, fürdők, előtér, közlekedő, WC és a teljes kültér. A terasz önálló pihenő- és étkezőhelyet kap; a jakuzzi megvalósíthatóságát külön kell igazolni.


# Miért ennyire drága?

A 20,55 millió Ft a teljes lakás és kültér berendezési, szerelési és átadási előirányzata. Sok külön feladat összege, nem egyetlen nappali ára.

**Fő változat**
**20,55 M Ft**
+2,55 M a kerethez képest

**Takarékos javaslat**
**19,90 M Ft**
+1,90 M a kerethez képest

**Alapkeret**
**18,00 M Ft**
+2,00 M külön tartalék

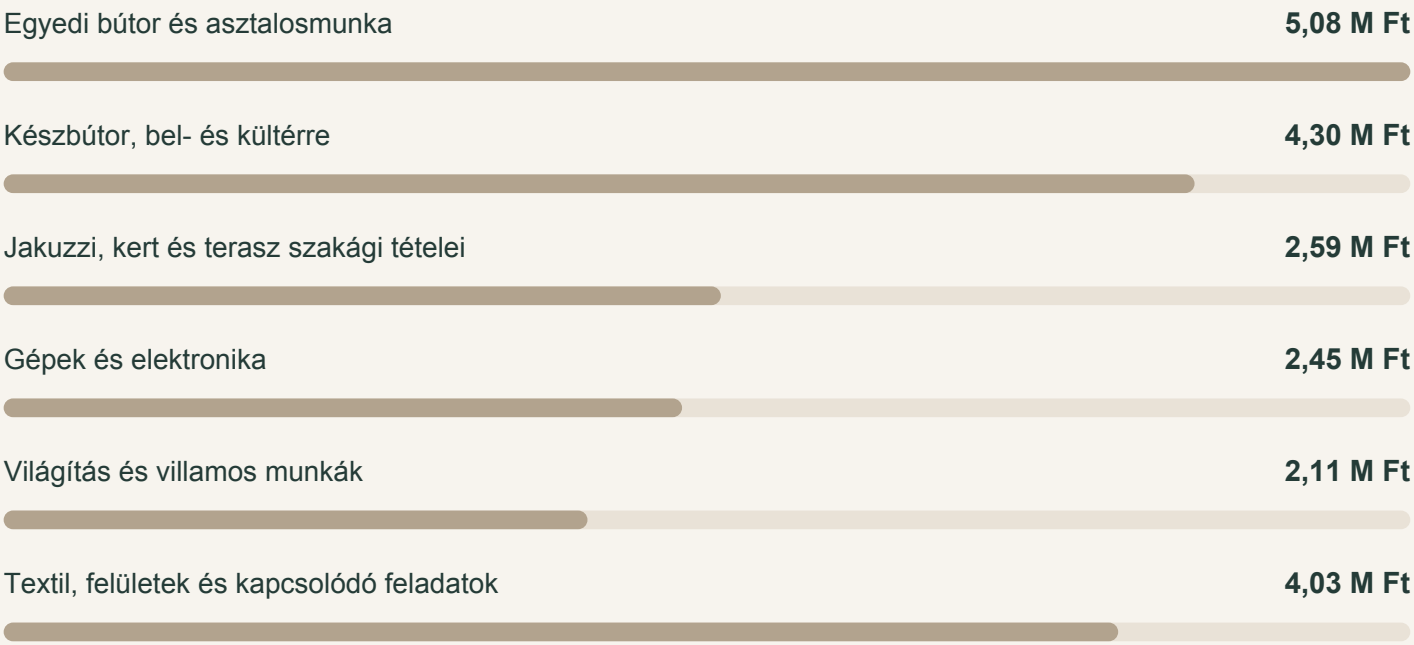


Az utolsó csoportban: textilek 1,33 M; falak és művészet 0,90 M; víz, üveg, tervezés, logisztika és kiegészítők együtt 1,80 M Ft. A kültéri bútor a készbútor sorban szerepel. Minden tételt egyszer számoltunk.

## Mi hajtja leginkább az árat?

A sok egyedi elem: 33 tervezett szerkezetnél az anyag mellé belső kialakítás, vasalat, megmunkálás és beépítés társul. A teljes tartalom: a jakuzzi és kapcsolódó munkái önmagukban 2,00 M Ft-ot képviselnek. A készre szerelt állapot: sín, varrás, táp, csatlakozó, felhordás és próbaüzem is pénzbe kerül.


**A legfontosabb szám most a bizonytalanság.**

Ellenőrzött webshop-termékár: 1,757 M Ft. Írásos beszállítói ajánlat: 0 Ft. Még becsült rész: 18,797 M Ft. A fő változat indikatív sávja 17,74-27,13 M Ft; az alsó érték nem keretígéret. A külön 2 M Ft tartalék érintetlen.

# Miért kell hozzá 17 hét?

Az idő jelentős része felmérésre, döntésre, gyártásra és szállításra megy el. Több feladat párhuzamosan haladhat, de a beépítéshez a megfelelő dolgoknak egyszerre kell készen lenniük.

### Jelenlegi, feltételes ütem a felmérés elindításától

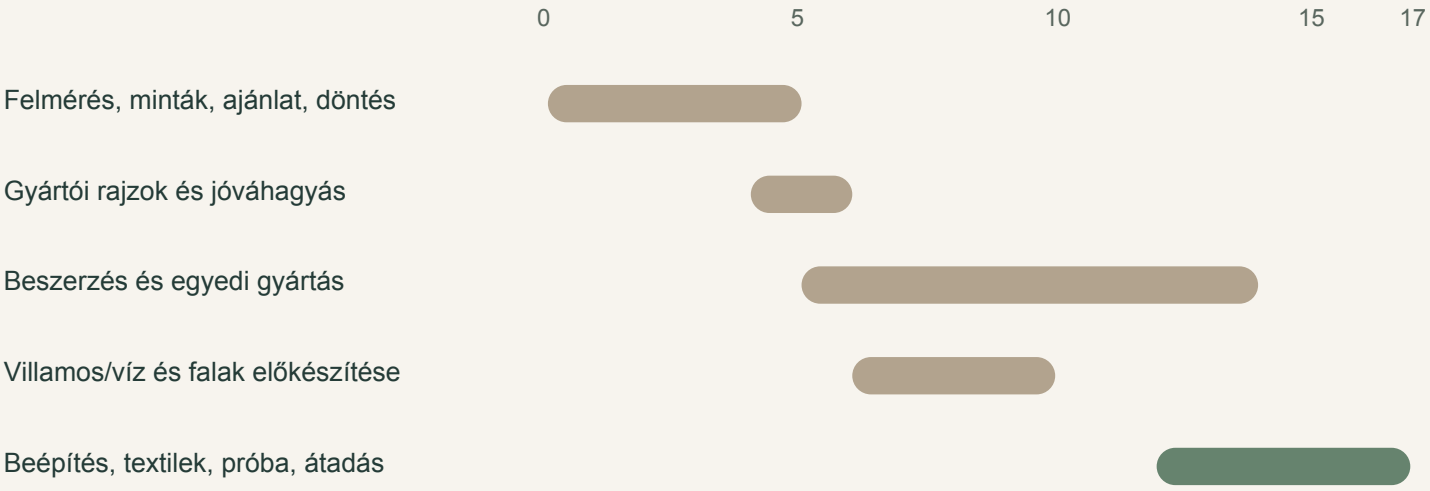


A kanapé korábban jelzett 8-9 hetes átfutása és az egyedi bútorok feltételezett 6 hetes gyártása fontos függőség. Egyik sem visszaigazolt vállalási határidő. A végső próba és hibajavítás is része a 17 hétnek.

## Mi jöhet közbe, és hogyan fogjuk meg időben?

**A valós méret eltér.**

A konyhai közlekedő jelenleg 84 cm. A kisebb hálóban az íróasztal és az erkélyajtó ütközik.

Teendő: Korai felmérés és az elrendezés lezárása, még gyártás előtt.

**A termék később érkezik.**

A webshop készletjelzése még nem igazolt magyar kiszállítás. Egy hiányzó fődarab az összképet is késleltetheti.

Teendő: Írásos átfutás és előre egyeztetett helyettesítő.

**A minta élőben más.**

A képernyőn látott taupe szín, textúra vagy tusnyomat a helyszíni fényben eltérhet.

Teendő: Kárpit- és felületminta, próbanyomat, majd egyetlen lezárt választás.


**A terasz feltétele nem adott.**

A jakuzzi terhe, beemelése és bekötése még nem igazolt. Az időjárás is korlátozhatja a munkát.

Teendő: Statikus és üzemeltető bevonása, korai logisztikai egyeztetés.

# Megéri ennyit rákölteni?

Akkor lehet jó döntés, ha a kialakítás a saját életeteket teszi tartósan kényelmesebbé, és a teljes költség vállalható. A render szépsége önmagában ehhez kevés.

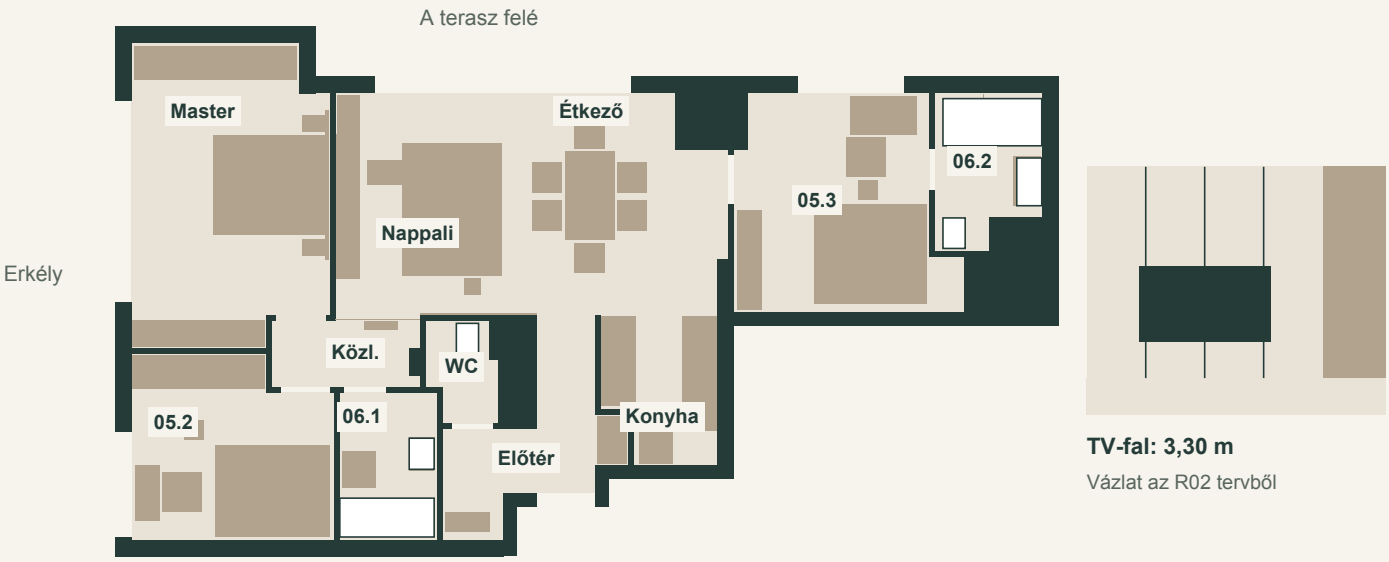


Vázlat az R02 tervből

A teljes lakás vázlata. Felmérés és a kisebb háló elrendezésének lezárása még szükséges.

## Amit érdemes megvédeni a döntések során

A lakás karakterét: a TV-fal, a nagy tusgrafika, az összehangolt felületek és a meleg esti fény együtt adják a Kyoto Ink lényegét. Ezeknél a részletek találkozása fontosabb, mint a márkanév önmagában.

A mindennapi használatot: kényelmes ülés, jó matrac, működő tároló, használható munkahely és hozzáférhető szerelvények. Ezek előnyét naponta érzékelni lehet, nem csak a fotón.

A javíthatóságot: elérhető tápegység, cserélhető fényforrás és hozzáférhető szifon. Egy szép felület mögött is karbantartható megoldásra van szükség.

## Mikor érdemes még megállni egy döntés előtt?

Ha a 18 millió Ft valódi felső határ, további tételes egyeztetés kell: a mostani takarékos javaslat csak 654 500 Ft-tal olcsóbb, és még 1,90 M Ft-tal keret felett van. Ha egy drága részletet alig használnál, kérj rá külön változatot, mielőtt elköteleződsz.

### A saját válaszod három kérdésből áll össze.

Melyik három elemet szeretnéd minden nap használni vagy látni? Melyik kompromisszum zavarna tartósan? Mekkora összeg vállalható kényelmesen? Eladásiár-növekedést vagy pénzügyi megtérülést a jelen terv nem bizonyít.

# Hogyan lehet korábban kész?

A gyorsítás legjobb esélye a korai, összehangolt döntés. A gyártási időt, a száradást és az ellenőrzéseket nem rövidítjük le bizonyíték nélkül.

## 17 hét → 15 hetes célváltozat

Feltételes szervezési forgatókönyv, körülbelül 2 hét nyerési lehetőséggel. Nem vállalt átadási dátum; a beszállítói visszaigazolások döntik el, tartható-e.

**01**

**Ma / tulajdonos**

Rögzíts három prioritást és a költségkeret valódi határát. Jelölj ki egy döntéshozót és heti 30 perc közös egyeztetést.

**02**

**1. hét / tervező + szakemberek**

Egy összehangolt felmérésen tisztázzák a konyhát, a kisebb háló munkahelyét, a kiállásokat, a küszöböt és a terasz feltételeit.

**03**

**1-2. hét / beszerző + tulajdonos**

A mintákat és az összehasonlítható ajánlatokat párhuzamosan készítsék elő. A hosszú átfutású fődarabokhoz kérjenek írásos szállítási időt.

**04**

**3. hét / tulajdonos**

Lezárt ár, változat és feltételek alapján dönts a kritikus beszerzésekről. Rendelés kizárólag külön engedéllyel; bizonytalan méretű egyedi bútort még ne indítsanak.

**05**

**3-5. hét / gyártó + tervező**

Zárják le a gyártói rajzokat és az anyagmintákat. A jóváhagyott részcsomagok előkészítése indulhat, ha műszakilag függetlenek a nyitott részektől.

### Mitől jön ki a 15 hét?

A hosszú átfutású beszerzés az 5. helyett a 3. héten indulhat, így 9 hét esetén a 12. hétre érkezhet. A gyártói rajzok a 3-5., az egyedi gyártás az 5-11., az előkészítés az 5-9. héten haladhat. Beépítés: 11-13. hét, a megérkezett részekkel. Üveg és textilek: 13-14. hét. Próba, javítás, átadás: 14-15. hét.

A feltétel: korán visszaigazolt gyártási és szerelési kapacitás, gyors mintadöntés, legfeljebb 1-2 hetes végső üveg/textil átfutás és nincs jelentős feltárási hiba. Ha ezek nem teljesülnek, a 17 hét is újratervezendő. A teljes tartalom megmarad; a tartalékot nem használjuk fel gyorsításra automatikusan.

Forrás: R02 élő költségregiszter, rajzcsomag, ütemterv és Blender-ellenőrzés. Az ötlapos bemutató a korábbi egyoldalas tulajdonosi összefoglaló helyébe lép. A 15 hetes változat új javaslat, nem módosítja automatikusan a műszaki tervet vagy a rendelési státuszt.
